

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE

ADEGUAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE



Progetto definitivo-esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Allegato H

IL PROGETTISTA
Ing. Salvatore Carta

Data

Gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Cherchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Pes


11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2018					OTT
				MAG	GIU	LUG	AGO	SET	
1	Diagramma di Gantt	109/152	07/05/2018						
2	Allestimento cantiere	4/4	07/05/2018						
3	Predisposizione area attrezzata per servizi	1/1	07/05/2018						
4	Baracche di cantiere	1/1	07/05/2018						
5	Servizi igienici di cantiere	1/1	08/05/2018						
6	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1	08/05/2018						
7	Ponteggio metallico fisso	1/1	09/05/2018						
8	Installazione ed uso argano a bandiera	1/1	09/05/2018						
9	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	10/05/2018						
10	Rimozione di infissi esterni	1/1	11/05/2018						
11	Rimozione di infissi interni	3/3	11/05/2018						
12	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	2/2	14/05/2018						
13	Rimozione di impianti	5/5	14/05/2018						
14	Demolizione di murature a mano	5/5	21/05/2018						
15	Demolizione di tramezzi	2/2	24/05/2018						
16	Rimozione di caldaia	2/2	28/05/2018						
17	Demolizione di pavimenti esterni	3/3	28/05/2018						
18	Rimozione di canali e discendenti	2/2	31/05/2018						
19	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	3/3	04/06/2018						
20	Demolizione di intonaco interno	3/3	05/06/2018						
21	Demolizione di intonaco esterno	2/2	07/06/2018						
22	Muratura in blocchi forati	4/4	11/06/2018						
23	Solaio in latero cemento gettato in opera (1)	6/6	15/06/2018						
24	Divisori in laterizio	3/3	25/06/2018						
25	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	2/2	25/06/2018						
26	Coibentazione del manto di copertura	2/2	27/06/2018						

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2018						OTT
				MAG	GIU	LUG	AGO	SET		
27	Posa e sistemazione rivestimenti esterni	6/6	29/06/2018		<div></div>	<div></div>				
28	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	3/3	02/07/2018		<div></div>					
29	Posa falsi telai per infissi interni ed esterni	2/2	09/07/2018			<div></div>				
30	Posa delle tubazioni	4/4	09/07/2018		<div></div>	<div></div>				
31	Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	4/4	13/07/2018		<div></div>	<div></div>				
32	Distribuzione acqua (1)	3/3	19/07/2018			<div></div>	<div></div>			
33	Installazione impianti di fonia e dati in rete	5/5	23/07/2018			<div></div>	<div></div>			
34	Chiusura di tracce e fori	5/5	30/07/2018			<div></div>	<div></div>			
35	Posa in opera di soglie per finestre	3/3	01/08/2018			<div></div>				
36	Intonaco interno con macchina intonacatrice	4/4	06/08/2018			<div></div>	<div></div>			
37	Intonaco esterno con macchina intonacatrice	5/5	06/08/2018			<div></div>	<div></div>			
38	Pavimenti di varia natura	7/7	13/08/2018			<div></div>	<div></div>			
39	Posa in opera di battiscopa	5/5	20/08/2018			<div></div>	<div></div>			
40	Realizzazione di rivestimenti	5/5	27/08/2018			<div></div>	<div></div>			
41	Tinteggiatura di pareti e soffitto a spruzzo	3/3	03/09/2018				<div></div>	<div></div>		
42	Tinteggiatura pareti esterne	3/3	05/09/2018				<div></div>	<div></div>		
43	Montaggio infissi esterni in PVC	3/3	10/09/2018				<div></div>	<div></div>		
44	Montaggio infissi interni in legno	3/3	12/09/2018				<div></div>	<div></div>		
45	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	2/2	13/09/2018				<div></div>	<div></div>		
46	Posa delle apparecchiature igieniche	2/2	17/09/2018				<div></div>	<div></div>		
47	Posa cavi e conduttori	5/5	19/09/2018				<div></div>	<div></div>		
48	Completamento impianto elettrico interno	3/3	26/09/2018				<div></div>	<div></div>		
49	Montaggio corpi radianti ed accessori	3/3	28/09/2018				<div></div>	<div></div>		
50	Completamento impianti fonia e dati	5/5	01/10/2018				<div></div>	<div></div>		
51	Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici	3/3	03/10/2018				<div></div>	<div></div>		
52	Smobilizzo cantiere	1/1	05/10/2018					<div></div>		

IMPORTO DEI LAVORI (€)

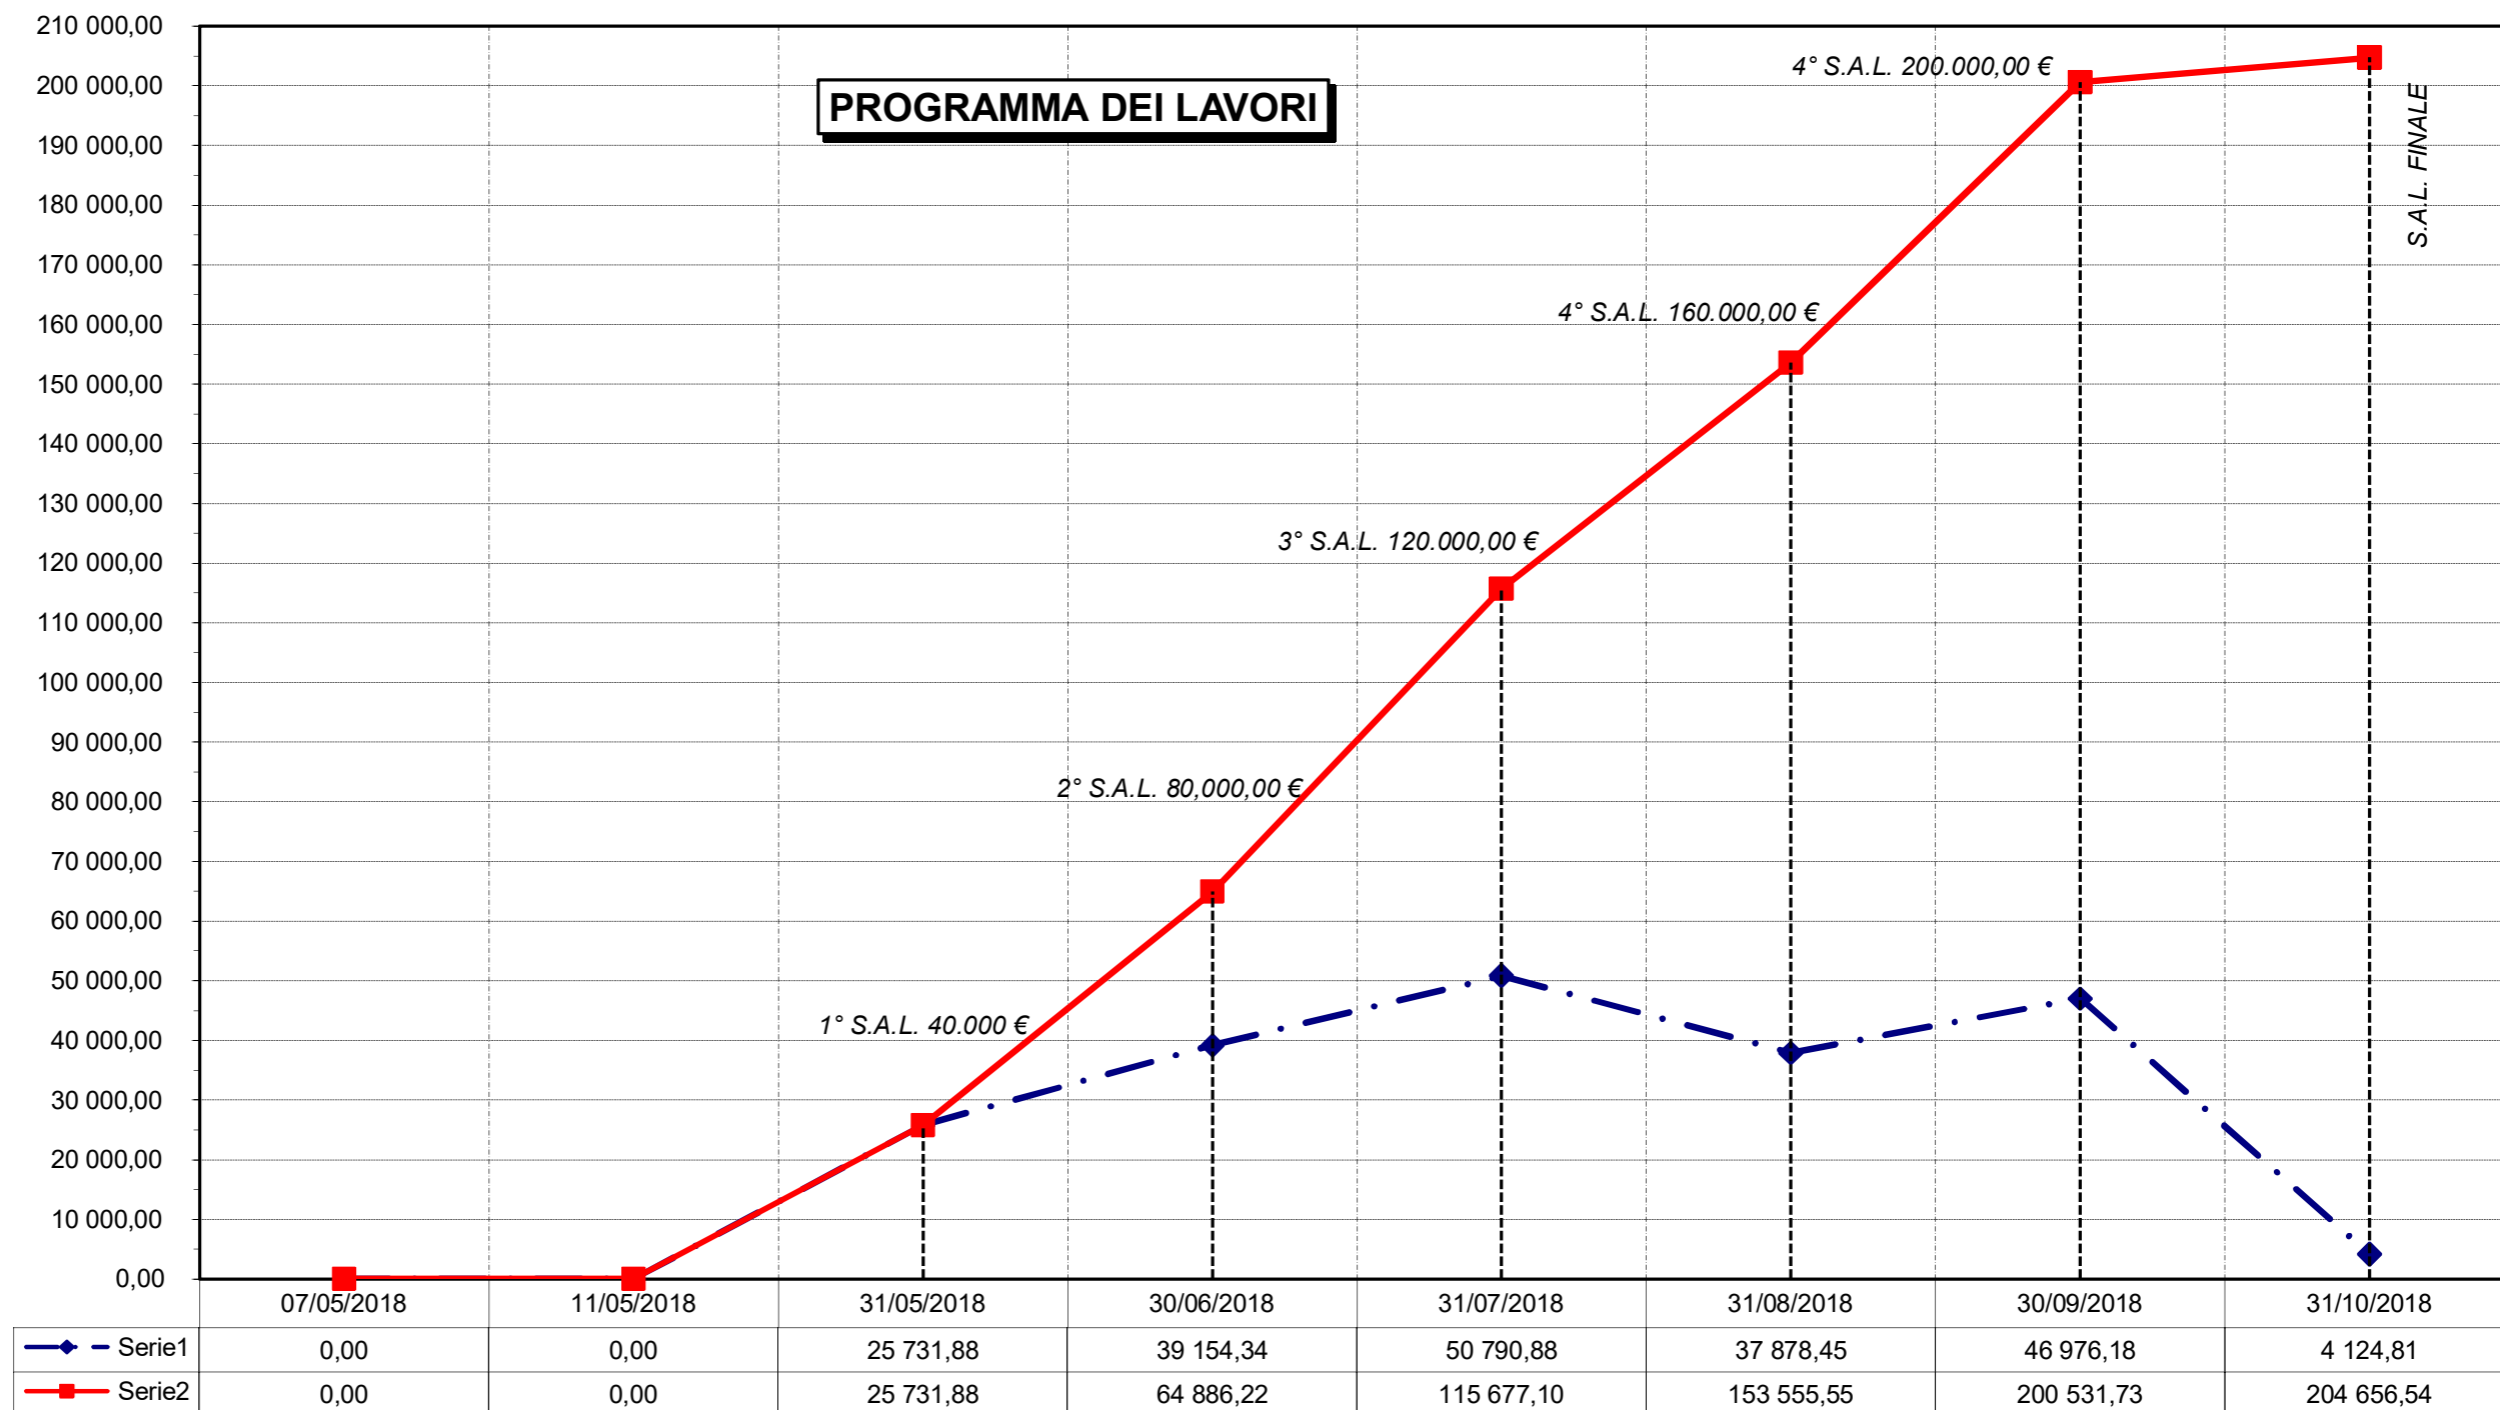

TEMPI (date)
